



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG**

JL. Ade Irma Nasution No.10 Telp (0711) 313431 Palembang



**LAPORAN / SURAT – MENYURAT  
HASIL PEMBAHASAN JUSTIFIKASI TEKNIK**

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi  
Paket : Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin)  
(DAK)  
No. Kontrak : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024  
Tgl. Kontrak : 06 Juni 2024  
Penyedia Jasa : PT. Lebong Karang Sakti  
Konsultan Supervisi: CV. Phitu Sima

**TAHUN ANGGARAN 2024**



# PT. LEBONG KARANG SAKTI

## General Contractor

Alamat : Jalan Kebun Semai No. 407 RT. 07 RW. 03 Palembang

Nomor : 110/LKS-CCO-SUNGSANG/VI/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Palembang, 24 Juni 2024

Kepada Yth;  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  
Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)  
di-  
Palembang

Hal : Permohonan Evaluasi Perubahan Volume Pekerjaan

Dengan Hormat,

Dengan telah berjalannya Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) dengan Nomor Kontrak : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024 tanggal 06 Juni 2024. Dengan ini kami sampaikan dari hasil pengamatan dan evaluasi pelaksanaan kondisi dilapangan dimana terdapat perubahan Volume Pekerjaan, untuk itu kami mohon persetujuan Penambahan dan Pengurangan Volume Pekerjaan. (Hasil Evaluasi terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. LEBONG KARANG SAKTI**



**SYARIFUDDIN SALEH**  
Direktur

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
2. Kepala Bidang Pengujian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
3. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
4. PPTK Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)
5. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**  
**PAKET REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN) (DAK)**  
Alamat : Jalan Kolonel H. Asmuni Nomor 222 Telp. (0712) 351016 Tanjung Raja.

Palembang, 26 Juni 2024

Nomor : 004/REKON.SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VI/2024  
Lamp :  
Hal : **Instruksi Evaluasi Volume Pekerjaan  
dan Pembuatan Draft Justifikasi Teknik.**

Kepada Yth.  
Sdr. Site Engineer  
CV. Phitu Sima  
Paket Rekonstruksi Jalan Akses  
TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)  
di-  
Palembang

Sehubungan dengan Surat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) Nomor : 622/ /REKONS-SUNGSANG/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, Hal : Instruksi Evaluasi Volume Pekerjaan, maka dengan ini kami Instruksikan kepada Saudara bersama - sama dengan Pihak Penyedia Jasa dan Pihak Kegiatan untuk mengadakan Evaluasi Volume Jenis Pekerjaan dilapangan dan kami instruksikan pula kepada Saudara untuk membuat Draft Justifikasi Teknik, berdasarkan hasil Evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dari proses perubahan Kontrak (Amandemen Kontrak).

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

**Saifuddin Hasibuan, ST., MM**  
NIP. 19690810 199903 1 007

**Tembusan : disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Bidang Jalan Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
2. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
3. Kepala Bidang Pengujian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
4. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
5. Arsip.



# CV. PHITU SIMA

DESIGN - SUPERVISION - FEASIBILITY STUDY - REGIONAL PLANNING - PROCUREMENT - COMMUNITY PARTICIPATION

Kantor : Jalan Demang Ibar Daun No. 2639 Rt. 01 Bukit Baru Telp (0711) 377812 Palembang 30139

Nomor : 006/PS-SE/CCO/REKON-TPI.SS/VII/2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth;  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)  
Di -  
Palembang.

Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Volume Pekerjaan dan  
Draft Justifikasi Teknik Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)

Memenuhi Surat Bapak Nomor : 011/REKON.SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, Hal : Instruksi Evaluasi Volume Pelaksanaan Pekerjaan dan Penyelesaian Draft Justifikasi Teknik Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK), dengan ini kami sampaikan hasil dari Evaluasi Volume Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan lampiran Penambahan dan Pengurangan Volume Pekerjaan (daftar terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Palembang, 27 Juni 2024  
Konsultan Pengawas

**Apri Yandi, ST**  
Supervision Engineer

**Tembusan** :disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Jalan Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
2. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
3. Kepala Bidang Pengujian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
4. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
5. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**BINA MARGA DAN TATA RUANG**

Jln. Ade Irma Nasution No. 10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax (0711) 317793  
PALEMBANG

Palembang, 25 Juni 2024

Nomor : 622/078/REKONS-  
SUNGSANG/VI/2024  
Lamp :  
Hal : **Instruksi Evaluasi Volume**  
**Pekerjaan.**

Kepada Yth.  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Rekonstruksi Jalan Akses TPI  
Sungsang (Banyuasin) (DAK)  
di-  
Palembang

Sehubungan dengan dilaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) dengan Nomor Kontrak : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024, tanggal 06 Juni 2024 dan Surat Penyedia Jasa PT. LEBONG KARANG SAKTI Nomor : 110/LKS-CCO-SUNGSANG/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024 Hal : Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan. Maka dengan ini kami Instruksikan kepada Saudara bersama -sama dengan Pihak Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa untuk mengadakan Evaluasi Volume Jenis Pekerjaan dilapangan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,

**POPO HARTOPO, ST**  
Penata Tk.I / III.d

NIP. 19830127 200801 1 002

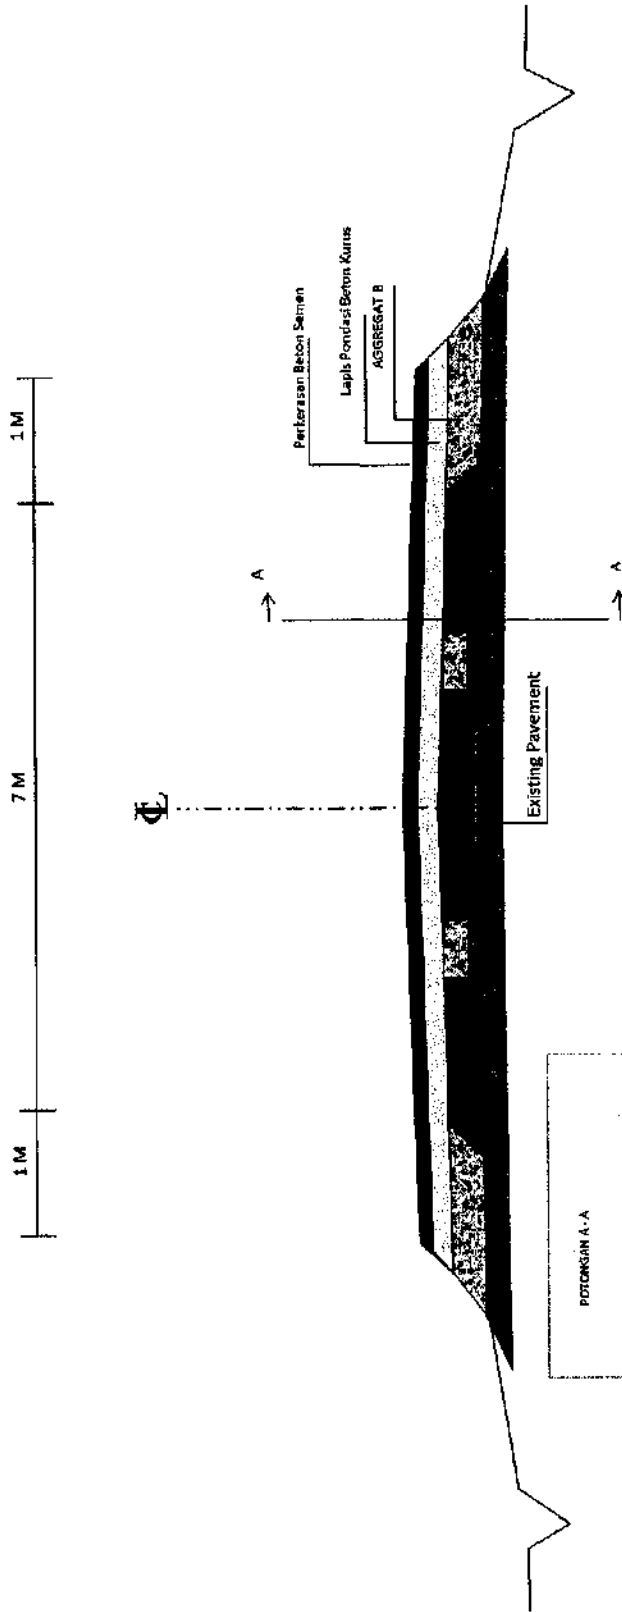
**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
2. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
3. Kepala Bidang Pengujian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
4. Arsip.

**DRAFT JUSTIFIKASI TEKNIK**

**SHOP DRAWING**

SHOP DRAWING (GAMBAR KERJA)  
 REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN) (DAK)



POTONGAN A-A

Beton Semen = 20 CM  
 Pondasi Beton Kurus = 10 CM  
 AGGREGAT B = 15 CM

Disetujui  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

*SAIFUDDIN HASIBUAN*  
 SAIFUDDIN HASIBUAN, ST., MM  
 NIP. 19690810 199903 1 007

Diperiksa Oleh,  
 Konsultan Supervisi  
 CV. PHITU SIMA

*APRIYANDI*  
 APRIYANDI, ST  
 Supervision Engineer

Diajukan Oleh,  
 PT. LEBONG KARANG SAKTI

*YUSRIZAL SEPTIANO*  
 YUSRIZAL SEPTIANO, ST  
 Manager Pelaksanaan





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**  
**PAKET REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN) (DAK)**

Alamat : Jalan Kolonel H. Asmuni Nomor 222 Telp. (0712) 351016 Tanjung Raja.

Palembang, 28 Juni 2024

Nomor : 005/REKONS.SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VI/2024  
Lamp : -  
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Volume PekerjaanKegiatan & Draft Justifikasi Teknik Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)

Kepada Yth.  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  
Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)  
di-  
Palembang

Menindak lanjuti Surat Bapak Nomor : 622/078/REKONS-SUNGSANG/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 Hal : Instruksi Evaluasi Volume Pekerjaan, dengan ini kami sampaikan hasil dari Pelaksanaan Evaluasi Volume tersebut sesuai dengan lampiran Penambahan dan Pengurangan Volume Pekerjaan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

**Saifuddin Hasibuan, ST., MM**  
NIP. 19690810 199903 1 007

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang JalanDinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
2. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
3. Penyedia Jasa PT. Lebong Karang Sakti Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)
4. Site Engineer CV. Phitu Sima Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)
5. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**BINA MARGA DAN TATA RUANG**

Jln. Ade Irma Nasution No. 10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax (0711) 317793  
PALEMBANG

Palembang, 29 Juni 2024

Nomor : 622/08/REKONS-SUNGSANG/VI/2024  
Lamp : -  
Hal : **Proses Pelaksanaan Evaluasi  
Penambahan & Pengurangan  
Volume Pekerjaan dan Draft  
Justifikasi Teknik.**

Kepada Yth.  
Ketua Panitia Peneliti  
Pelaksanaan Kontrak Kegiatan  
Rekonstruksi Jalan Akses TPI  
Sungsang (Banyuasin) (DAK)  
di-  
Palembang

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh unsur Penyedia Jasa dan Unsur Konsultan Pengawas serta Unsur Pelaksana Teknis Kegiatan dan Surat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Nomor : 005/REKONS.SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi Volume Pekerjaan dan Draft Justifikasi Teknik Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK).

Dengan ini kiranya segera dapat mengevaluasi perubahan Penambahan dan Pengurangan Volume Kontrak Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK).

Demikian untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,

**POPO HARTOPO, ST**

Penata Tk.I / III.d

NIP. 19830127 200801 1 002

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Jalan Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
2. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel.
3. Penyedia Jasa PT. LEBONG KARANG SAKTI Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK).
4. Konsultan Pengawas CV. Phitu Sima Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK).
5. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**BINA MARGA DAN TATA RUANG**

Jln. Ade Irma Nasution No. 10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax (0711) 317793  
PALEMBANG

Palembang, 12 Juli 2024

Nomor : 622/001/DIS.PUBMTR/VII/2024  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Rapat Contract Change Order (CCO)**

Kepada Yth.

1. Kuasa Pengguna Anggaran Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)
  2. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)
  3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)
  4. Direktur/Manager Pelaksanaan PT. Lebong Karang Sakti
  5. Direktur/Supervision Engineer CV. Phitu Sima
- di-  
Tempat

Sehubungan dengan Kontrak Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) Nomor : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024 tanggal 06 Juni 2024, guna melakukan pelaksanaan kontrak, bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari / tanggal : Senin / 15 Juli 2024  
Jam : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat UPTD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan  
Acara : **Rapat Peneliti Pelaksanaan Kontrak**

Demikian atas kehadirannya Saudara diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak  
Ketua,

**Upik. ST**

NIP. 19671111 199203 2 004

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (sebagai laporan);
2. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**BINA MARGA DAN TATA RUANG**

Jln. Ade Irma Nasution No. 10 Telp. (0711) 313431, 351855 Fax (0711) 317793  
PALEMBANG

**DAFTAR HADIR**

Kegiatan : Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK).  
Hari / Tanggal : Senin / 15 Juli 2024  
J a m : 09.00 Wib s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat UPTD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan  
Acara : **Rapat Peneliti Pelaksanaan Kontrak**

| NO | NAMA               | JABATAN         | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 2                  | 3               | 4            |
|    | UPIK               | Panitia         |              |
|    | YUSRIZAL -S        | MANPBL PT-Lebag |              |
|    | Apri yandi         | SE Konsultan    |              |
|    | Riky Fady          | SAAP PT. Lebag  |              |
|    | Risman *           | Anggota         |              |
|    | Hency              | Sekretaris      |              |
|    | Herman Jamal       | Core Team       |              |
|    | Jonus              | Anggota         |              |
|    | Yenny Marissa      | Anggota         |              |
|    | SAIFUDDIN HASIBUAN | PPTR            |              |
|    | Popo Hatape        | PPA             |              |

Ketua,

**Upik, ST**

NIP. 19671111 199203 2 004

**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK**  
KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN) (DAK)  
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

---

**BERITA ACARA HASIL RAPAT**  
**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK**  
Nomor : 002/PAN/REKONS-SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (15-07-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penelitian Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 012/KPA/UPTD.JJ-KAB.OKU/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 13 Juni 2024 telah mengadakan Rapat Penelitian terhadap Pelaksanaan Kontrak untuk Proses Amandemen Kontrak Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) dengan penjelasan sebagai berikut:

**I. Data Kegiatan**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Paket         | : Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) |
| Nomor Kontrak      | : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024                       |
| Tanggal Kontrak    | : 06 Juni 2024  |
| Nilai Kontrak      | : Rp. 21.438.438.000,-                                    |
| Kontraktor         | : PT. Lebong Karang Sakti                                 |
| Konsultan Pengawas | : CV. Phitu Sima  |
| Sumber Dana        | : Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024                          |
| Tahun Anggaran     | : 2024  |
| SPMK               | : 622/00322/DIS.PUBMTR/SPMK/2024                          |
| Tanggal SPMK       | : 07 Juni 2024  |
| Waktu pelaksanaan  | : 180 hari kalender                                       |
| Waktu Pemeliharaan | : 180 hari kalender                                       |
| Rencana PHO        | : 03 Desember 2024  |
| Rencana FHO        | : 01 Juni 2025  |

**II. Lingkup Pekerjaan Perubahan :**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Panjang Fungsional | : 11,10 Km |
| Panjang Efektif    | : 2,800 Km |

Jenis Pekerjaan Sesuai Perubahan :

**- DIVISI 1. UMUM**

Mobilisasi

Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Manajemen Mutu

**- DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK**

Penyiapan Badan Jalan

**- DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR**

Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B

Perkerasan Beton Semen

Lapis Pondasi bawah Beton Kurus

- **DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL**  
Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi  
Laston Lapis Aus (AC-WC)
- **DIVISI 7. STRUKTUR**  
Beton, Fc'15 Mpa
- **DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN**  
Marka Jalan Termoplastik
- **DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA**  
Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A  
Perbaikan Campuran Aspal Panas  
Pengendalian Tanaman

### **III. Dasar Penelitian :**

1. Kontrak Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) Nomor : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024, tanggal 06 Juni 2024.
2. Surat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK) Nomor : 622/08/REKONS-SUNGSANG/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 Hal: Proses Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Penambahan dan Pengurangan Volume Pekerjaan dan Draft Justifikasi Teknik.
3. Data Justifikasi Teknis dari Konsultan Pengawas.

### **IV. Permasalahan :**

Dari hasil Field Engineering dan Evaluasi Volume pekerjaan yang ada dalam Dokumen Kontrak awal yang dilaksanakan bersama Pihak Pelaksana Kegiatan, Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa serta untuk mendapatkan volume pekerjaan yang sesuai kondisi lapangan, maka diperlukan perubahan volume pekerjaan ( Penambahan dan Pengurangan ).

### **V. Pembahasan :**

Pembahasan meliputi:

1. Meneliti dan mempelajari data-data lapangan antara lain hasil Evaluasi dan Kondisi Lapangan
2. Hasil akhir pelaksanaan lapangan yang memerlukan penambahan dan Pengurangan Volume Pekerjaan sesuai dengan usulan dalam Justifikasi Teknik.
3. Terjadinya Penambahan dan Pengurangan Volume jenis pekerjaan dilapangan dari hasil Evaluasi lapangan dan kondisi lapangan yang ada.
4. Panitia membahas Konsep Justifikasi Teknik untuk permasalahan tersebut Penambahan dan Pengurangan Volume Jenis Pekerjaan untuk dilanjutkan ke Proses Amandemen Kontrak .






### **VI. Kesimpulan :**

Dari hasil pembahasan diatas, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk Penambahan dan Pengurangan Volume Jenis Pekerjaan telah sepakat untuk menyetujui perubahan sebagai berikut:

1. Volume Jenis Pekerjaan Penambahan dan pengurangan (daftar terlampir)
2. Dari hasil rapat evaluasi tersebut diatas disepakati dengan Penyedia Jasa bahwa Perubahan Volume mengacu dengan Hasil Evaluasi yang dilakukan bersama.
3. Di sepakati Nilai Kontrak Tetap.
4. Waktu Pelaksanaan Tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, tanggal tersebut diatas

| NO | NAMA  | JABATAN    | TANDA TANGAN   |
|----|---|------------|--|
| 1. | <b>Upik, ST</b><br>NIP. 196711111992032004                  | Ketua      | 1.....  |
| 2. | <b>Herly</b><br>NIP. 196707201991031004                     | Sekretaris | 2.....  |
| 3. | <b>Hj. Yossi Marissa, ST, MT</b><br>NIP. 198103242008012014 | Anggota    | 3.....  |
| 4. | <b>Jonius Purwanto, ST</b><br>NIP. 197906212008011001       | Anggota    | 4.....  |
| 5. | <b>Risman Friansyah, ST, MT</b><br>NIP. 198509022011011005  | Anggota    | 5.....  |

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**Saifuddin Hasibuan, ST, MM**  
NIP. 19690810 199903 1 007

Konsultan Supervisi  
CV. Phitu Sima,




**Apri Yandi, ST**  
Supervision Engineer

Penyedia Jasa  
PT. Lebong Karang Sakti,



**Yusrizal Septiano, ST**  
Manager Pelaksanaan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,



**Podo Hartopo, ST**  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 19830127 200801 1 002

**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK**  
**KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN) (DAK)**  
**DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Nomor : 03/PAN/REKONS-SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VII /2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Palembang, 15 Juli 2024

Kepada Yth.  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  
Rekonstruksi Jalan Akses TPI  
Sungsang (Banyuasin) (DAK)  
di-  
Palembang

Hal : Penyampaian Berita Acara Hasil Pembahasan Tambah Kurang  
Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor : 622/ 081 /REKONS-SUNGSANG/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 Hal : Proses Pelaksanaan Evaluasi Perubahan Penambahan dan Pengurangan Volume Kontrak dan Draft Justifikasi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK), maka dengan ini kami sampaikan Berita Acara Hasil Pembahasan Justifikasi Teknik (Berita Acara Terlampir)

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak  
Ketua,



**Upik ST**

NIP. 19671111 199203 2 004

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Jalan Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
2. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
3. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel;
4. Arsip.



**TIME SCHEDULE CCO**

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No. Item : Nomor/urutan nomor item pekerjaan
Nama Item / Temporal : 08-09-15/0000\_FISIK/TAHAP/TAHAP004 (8 Juni 2014)
Kontraktor : PT. LEBONG BARANG BAKTI
Mekanisme Pembayaran : C/K PARTI BUKA

Table with columns: No. Item, Deskripsi, Rincian, and 24 columns for monthly payments (1-24). Includes detailed task descriptions and numerical values.

PT. LEBONG BARANG BAKTI
Representative Signature

Kendali Kualitas
CV. RIFITS BAKTI
Representative Signature


Dewan Pengawasan Pelaksanaan
CV. RIFITS BAKTI
Representative Signature
PT. LEBONG BARANG BAKTI
Jalan... No. 08-09-15/0000


## DAFTAR Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah dan Kurang Contract Changer Order Balance Budget

| No. Item Pekerjaan | Uraian                                    | ESTIMASI |                   |                   | REALISASI |                   |                   | TAMBAH        |                   |                   | KURANG |                   |                   |
|--------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
|                    |   | Volume   | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Volume    | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Volume        | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
| 1.2                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 1,5      | 60.000.000,00     | 90.000.000,00     | 0,26%     | 1,00              | 60.000.000,00     | 60.000.000,00 | 1,00              | 60.000.000,00     | 0,26%  | 1,26%             |                   |
| 1.3                |   | 1,03     | 60.000.000,00     | 60.600.000,00     | 0,10%     | 1,03              | 60.600.000,00     | 60.600.000,00 | 1,03              | 60.600.000,00     | 0,10%  | 1,36%             |                   |
| 1.4                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 1,00     | 900.000,00        | 900.000,00        | 0,00%     | 1,00              | 900.000,00        | 900.000,00    | 1,00              | 900.000,00        | 0,00%  | 1,36%             |                   |
| 1.5                |   | 1,00     | 900.000,00        | 900.000,00        | 0,00%     | 1,00              | 900.000,00        | 900.000,00    | 1,00              | 900.000,00        | 0,00%  | 1,36%             |                   |
| 1.6                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 15,00    | 4.000,00          | 60.000,00         | 0,04%     | 15,00             | 4.000,00          | 60.000,00     | 15,00             | 4.000,00          | 0,04%  | 1,40%             |                   |
| 1.7                |   | 2,00     | 225.000,00        | 450.000,00        | 0,46%     | 2,00              | 225.000,00        | 450.000,00    | 2,00              | 225.000,00        | 0,46%  | 1,40%             |                   |
| 1.8                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 325.000,00        | 650.000,00        | 0,67%     | 2,00              | 325.000,00        | 650.000,00    | 2,00              | 325.000,00        | 0,67%  | 1,40%             |                   |
| 1.9                |   | 2,00     | 225.000,00        | 450.000,00        | 0,46%     | 2,00              | 225.000,00        | 450.000,00    | 2,00              | 225.000,00        | 0,46%  | 1,40%             |                   |
| 2.0                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 225.000,00        | 450.000,00        | 0,46%     | 2,00              | 225.000,00        | 450.000,00    | 2,00              | 225.000,00        | 0,46%  | 1,40%             |                   |
| 2.1                |   | 2,00     | 225.000,00        | 450.000,00        | 0,46%     | 2,00              | 225.000,00        | 450.000,00    | 2,00              | 225.000,00        | 0,46%  | 1,40%             |                   |
| 2.2                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 3,00     | 47.500,00         | 142.500,00        | 0,14%     | 3,00              | 47.500,00         | 142.500,00    | 3,00              | 47.500,00         | 0,14%  | 1,40%             |                   |
| 2.3                |   | 3,00     | 47.500,00         | 142.500,00        | 0,14%     | 3,00              | 47.500,00         | 142.500,00    | 3,00              | 47.500,00         | 0,14%  | 1,40%             |                   |
| 2.4                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 47.500,00         | 95.000,00         | 0,09%     | 2,00              | 47.500,00         | 95.000,00     | 2,00              | 47.500,00         | 0,09%  | 1,40%             |                   |
| 2.5                |   | 2,00     | 47.500,00         | 95.000,00         | 0,09%     | 2,00              | 47.500,00         | 95.000,00     | 2,00              | 47.500,00         | 0,09%  | 1,40%             |                   |
| 2.6                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 3.000,00          | 6.000,00          | 0,00%     | 2,00              | 3.000,00          | 6.000,00      | 2,00              | 3.000,00          | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.7                |   | 2,00     | 3.000,00          | 6.000,00          | 0,00%     | 2,00              | 3.000,00          | 6.000,00      | 2,00              | 3.000,00          | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.8                | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 17.500,00         | 35.000,00         | 0,03%     | 2,00              | 17.500,00         | 35.000,00     | 2,00              | 17.500,00         | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.9                |   | 2,00     | 17.500,00         | 35.000,00         | 0,03%     | 2,00              | 17.500,00         | 35.000,00     | 2,00              | 17.500,00         | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.10               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 95.000,00         | 190.000,00        | 0,18%     | 2,00              | 95.000,00         | 190.000,00    | 2,00              | 95.000,00         | 0,18%  | 1,40%             |                   |
| 2.11               |   | 2,00     | 95.000,00         | 190.000,00        | 0,18%     | 2,00              | 95.000,00         | 190.000,00    | 2,00              | 95.000,00         | 0,18%  | 1,40%             |                   |
| 2.12               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 1,00     | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 0,17%     | 1,00              | 22.000.000,00     | 22.000.000,00 | 1,00              | 22.000.000,00     | 0,17%  | 1,40%             |                   |
| 2.13               |   | 1,00     | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 0,17%     | 1,00              | 22.000.000,00     | 22.000.000,00 | 1,00              | 22.000.000,00     | 0,17%  | 1,40%             |                   |
| 2.14               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 8,00     | 3.250.000,00      | 26.000.000,00     | 0,19%     | 8,00              | 3.250.000,00      | 26.000.000,00 | 8,00              | 3.250.000,00      | 0,19%  | 1,40%             |                   |
| 2.15               |   | 8,00     | 3.250.000,00      | 26.000.000,00     | 0,19%     | 8,00              | 3.250.000,00      | 26.000.000,00 | 8,00              | 3.250.000,00      | 0,19%  | 1,40%             |                   |
| 2.16               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 1,00     | 4.250.000,00      | 4.250.000,00      | 0,03%     | 1,00              | 4.250.000,00      | 4.250.000,00  | 1,00              | 4.250.000,00      | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.17               |   | 1,00     | 4.250.000,00      | 4.250.000,00      | 0,03%     | 1,00              | 4.250.000,00      | 4.250.000,00  | 1,00              | 4.250.000,00      | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.18               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 1,00     | 2.750.000,00      | 2.750.000,00      | 0,02%     | 1,00              | 2.750.000,00      | 2.750.000,00  | 1,00              | 2.750.000,00      | 0,02%  | 1,40%             |                   |
| 2.19               |   | 1,00     | 2.750.000,00      | 2.750.000,00      | 0,02%     | 1,00              | 2.750.000,00      | 2.750.000,00  | 1,00              | 2.750.000,00      | 0,02%  | 1,40%             |                   |
| 2.20               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 3,00     | 175.000,00        | 525.000,00        | 0,00%     | 3,00              | 175.000,00        | 525.000,00    | 3,00              | 175.000,00        | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.21               |   | 3,00     | 175.000,00        | 525.000,00        | 0,00%     | 3,00              | 175.000,00        | 525.000,00    | 3,00              | 175.000,00        | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.22               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 6,00     | 175.000,00        | 1.050.000,00      | 0,01%     | 6,00              | 175.000,00        | 1.050.000,00  | 6,00              | 175.000,00        | 0,01%  | 1,40%             |                   |
| 2.23               |   | 6,00     | 175.000,00        | 1.050.000,00      | 0,01%     | 6,00              | 175.000,00        | 1.050.000,00  | 6,00              | 175.000,00        | 0,01%  | 1,40%             |                   |
| 2.24               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 20,00    | 225.000,00        | 4.500.000,00      | 0,03%     | 20,00             | 225.000,00        | 4.500.000,00  | 20,00             | 225.000,00        | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.25               |   | 20,00    | 225.000,00        | 4.500.000,00      | 0,03%     | 20,00             | 225.000,00        | 4.500.000,00  | 20,00             | 225.000,00        | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.26               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 3,00     | 145.000,00        | 435.000,00        | 0,00%     | 3,00              | 145.000,00        | 435.000,00    | 3,00              | 145.000,00        | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.27               |   | 3,00     | 145.000,00        | 435.000,00        | 0,00%     | 3,00              | 145.000,00        | 435.000,00    | 3,00              | 145.000,00        | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.28               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 145.000,00        | 290.000,00        | 0,00%     | 2,00              | 145.000,00        | 290.000,00    | 2,00              | 145.000,00        | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.29               |   | 2,00     | 145.000,00        | 290.000,00        | 0,00%     | 2,00              | 145.000,00        | 290.000,00    | 2,00              | 145.000,00        | 0,00%  | 1,40%             |                   |
| 2.30               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 2,00     | 1.000.000,00      | 2.000.000,00      | 0,01%     | 2,00              | 1.000.000,00      | 2.000.000,00  | 2,00              | 1.000.000,00      | 0,01%  | 1,40%             |                   |
| 2.31               |   | 2,00     | 1.000.000,00      | 2.000.000,00      | 0,01%     | 2,00              | 1.000.000,00      | 2.000.000,00  | 2,00              | 1.000.000,00      | 0,01%  | 1,40%             |                   |
| 2.32               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 9,00     | 480.000,00        | 4.320.000,00      | 0,03%     | 9,00              | 480.000,00        | 4.320.000,00  | 9,00              | 480.000,00        | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.33               |   | 9,00     | 480.000,00        | 4.320.000,00      | 0,03%     | 9,00              | 480.000,00        | 4.320.000,00  | 9,00              | 480.000,00        | 0,03%  | 1,40%             |                   |
| 2.34               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 9,00     | 2.000.000,00      | 18.000.000,00     | 0,14%     | 9,00              | 2.000.000,00      | 18.000.000,00 | 9,00              | 2.000.000,00      | 0,14%  | 1,40%             |                   |
| 2.35               |   | 9,00     | 2.000.000,00      | 18.000.000,00     | 0,14%     | 9,00              | 2.000.000,00      | 18.000.000,00 | 9,00              | 2.000.000,00      | 0,14%  | 1,40%             |                   |
| 2.36               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 9,00     | 750.000,00        | 6.750.000,00      | 0,05%     | 9,00              | 750.000,00        | 6.750.000,00  | 9,00              | 750.000,00        | 0,05%  | 1,40%             |                   |
| 2.37               |   | 9,00     | 750.000,00        | 6.750.000,00      | 0,05%     | 9,00              | 750.000,00        | 6.750.000,00  | 9,00              | 750.000,00        | 0,05%  | 1,40%             |                   |
| 2.38               | Pekerjaan pemasangan tiang pemukiman BLAK | 1,00     | 81.650.000,00     | 81.650.000,00     | 0,32%     | 1,00              | 81.650.000,00     | 81.650.000,00 | 1,00              | 81.650.000,00     | 0,32%  | 1,40%             |                   |
| 2.39               |   | 1,00     | 81.650.000,00     | 81.650.000,00     | 0,32%     | 1,00              | 81.650.000,00     | 81.650.000,00 | 1,00              | 81.650.000,00     | 0,32%  | 1,40%             |                   |

| No. Urut<br>Penggunaan | Uraian                                  | KONTAK      |                    |                     |                    | MAGAS       |                    |                     |                    | VOLUME            |                    |                     |                    | Kategori | MRT    |
|------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|
|                        |   | Volume      | Harga<br>Rata-rata | Volume<br>Kumulatif | Harga<br>Rata-rata | Volume      | Harga<br>Rata-rata | Volume<br>Kumulatif | Harga<br>Rata-rata | Volume            | Harga<br>Rata-rata | Volume<br>Kumulatif | Harga<br>Rata-rata |          |        |
| 33.01                  | DORNI S. PERKORAN TAMAN DAN RESOR LINA  | 22.410,00   | 14.420,17          | 320.158.843,67      | 14.420,17          | 22.410,00   | 320.158.843,67     | 14.420,17           | 22.410,00          | 320.158.843,67    | 14.420,17          | 22.410,00           | 320.158.843,67     | 1,07%    | 1,07%  |
| 33.02                  | DORNI S. PERKORAN TAMAN DAN RESOR LINA  | 3.384,30    | 1.124.962,66       | 3.813.842.418,07    | 1.124.962,66       | 2.780,20    | 3.107.939.286,47   | 3.107.939.286,47    | 2.780,20           | 3.107.939.286,47  | 3.107.939.286,47   | 3.107.939.286,47    | 3.107.939.286,47   | 10,49%   | 10,49% |
| 33.03                  | Lapis Persegi Panjang Keras P           | 3.468,00    | 3.184.042,00       | 11.134.430.403,14   | 3.184.042,00       | 3.588,04    | 31.260.338.987,47  | 31.260.338.987,47   | 3.588,04           | 31.260.338.987,47 | 31.260.338.987,47  | 31.260.338.987,47   | 31.260.338.987,47  | 20,07%   | 20,07% |
| 33.04                  | Perumahan Baitan Baitan                 | 1.787,30    | 2.650,1929         | 3.820.403,341       | 2.650,1929         | 1.786,42    | 3.638.014.736,26   | 3.638.014.736,26    | 1.786,42           | 3.638.014.736,26  | 3.638.014.736,26   | 3.638.014.736,26    | 3.638.014.736,26   | 19,59%   | 19,59% |
| 33.05                  | DORNI S. PERKORAN TAMAN DAN RESOR LINA  | 1.000,00    | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00    | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,07%    | 0,07%  |
| 33.06                  | Lapis Persegi - Aksis Cembung           | 1.500,00    | 2.314,8716         | 3.532.809,401       | 2.314,8716         | 1.500,00    | 3.532.809,401      | 3.532.809,401       | 1.500,00           | 3.532.809,401     | 3.532.809,401      | 3.532.809,401       | 3.532.809,401      | 1,52%    | 1,52%  |
| 33.07                  | DORNI S. PERKORAN TAMAN DAN RESOR LINA  | 21,00       | 1.900,7368         | 37.815,2660         | 1.900,7368         | 21,00       | 37.815,2660        | 37.815,2660         | 21,00              | 37.815,2660       | 37.815,2660        | 37.815,2660         | 37.815,2660        | 0,02%    | 0,02%  |
| 33.08                  | Baitan, K-13 Mpa                        | 75,30       | 271.776,93         | 20.484.780,24       | 271.776,93         | 75,30       | 20.484.780,24      | 20.484.780,24       | 75,30              | 20.484.780,24     | 20.484.780,24      | 20.484.780,24       | 20.484.780,24      | 0,11%    | 0,11%  |
| 33.09                  | DORNI S. PERKORAN TAMAN DAN RESOR LINA  | 4,00        | 1.920,6818         | 7.714,2728          | 1.920,6818         | 4,00        | 7.714,2728         | 7.714,2728          | 4,00               | 7.714,2728        | 7.714,2728         | 7.714,2728          | 7.714,2728         | 0,04%    | 0,04%  |
| 33.10                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras A | 11,52       | 4.978,4823         | 58.073,7675         | 4.978,4823         | 11,52       | 58.073,7675        | 58.073,7675         | 11,52              | 58.073,7675       | 58.073,7675        | 58.073,7675         | 58.073,7675        | 0,28%    | 0,28%  |
| 33.11                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras B | 10,000,00   | 1.450,18           | 14.501,7971         | 1.450,18           | 10,000,00   | 14.501,7971        | 14.501,7971         | 10,000,00          | 14.501,7971       | 14.501,7971        | 14.501,7971         | 14.501,7971        | 0,08%    | 0,08%  |
| 33.12                  | DORNI S. PERKORAN TAMAN DAN RESOR LINA  | 14.315,5847 | 14.315,5847        | 207.216,1137        | 14.315,5847        | 14.315,5847 | 207.216,1137       | 207.216,1137        | 14.315,5847        | 207.216,1137      | 207.216,1137       | 207.216,1137        | 207.216,1137       | 10,92%   | 10,92% |
| 33.13                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras C | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |
| 33.14                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras D | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |
| 33.15                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras E | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |
| 33.16                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras F | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |
| 33.17                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras G | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |
| 33.18                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras H | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |
| 33.19                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras I | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |
| 33.20                  | Pengisian Lapis Persegi Panjang Keras J | 21.000,00   | 2.314,8716         | 48.612,2034         | 2.314,8716         | 21.000,00   | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 21.000,00          | 48.612,2034       | 48.612,2034        | 48.612,2034         | 48.612,2034        | 2,15%    | 2,15%  |

Disetujui dan Ditanda-tangani oleh  
 Direktur Teknik  
  
 PT. PERTAMINA (PERSERO) Tbk  
 Kantor Pusat  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119

Disetujui dan Ditanda-tangani oleh  
 Kepala Kantor  
  
 Kantor Teknik  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119


Disetujui dan Ditanda-tangani oleh  
 Kepala Kantor  
  
 Kantor Teknik  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119

Disetujui dan Ditanda-tangani oleh  
 Kepala Kantor  
  
 Kantor Teknik  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119

Palembang, 18 Juli 2024  
 Penerima Permohonan Pengesahan  
 (Revisi/Perbaikan) :  
 1. Ulin, ST  
 2. Hery  
 3. Yudi Ningsih, ST, MT : Angkola  
 4. Herman Purnomo, ST, MT : Angkola  
 5. Jonan Purnomo, ST : Angkola

Penerima Jasa  
 PT. LINDA LINDA (PERSERO) Tbk  
  
 Kantor Pusat  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119

Penerima Jasa  
 PT. LINDA LINDA (PERSERO) Tbk  
  
 Kantor Pusat  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119

Penerima Jasa  
 PT. LINDA LINDA (PERSERO) Tbk  
  
 Kantor Pusat  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119

Penerima Jasa  
 PT. LINDA LINDA (PERSERO) Tbk  
  
 Kantor Pusat  
 Jl. H. R. Soebsana No. 100  
 Jakarta Pusat 10119



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**  
**PAKET REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN) (DAK)**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG**

Nomor : 103/REKONS-SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VII/2024

**DATA KEGIATAN**

1. Program : Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sumatera Selatan
2. Paket : Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) (DAK)
3. Data Kontrak
  - 3.1. Nomor : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024
  - 3.2. Tanggal : 06 Juni 2024
  - 3.3. Nilai Kontrak : Rp. 21,438.438.600,00
  - 3.4. Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024
  - 3.5. Penyedia Jasa : PT. LEBONG KARANG SAKTI
  - 3.6. Konsultan Pengawas : CV. PHITU SIMA
4. Surat Permohonan Penyedia Jasa
  - 4.1. Nomor : 110/LKS-CCO-SUNGSANG/VI/2024
  - 4.2. Tanggal : 24 Juni 2024

**KESIMPULAN PERUBAHAN PELAKSANAAN KONTRAK**

| <b>Rekomendasi Teknik</b>   | <b>Rekomendasi Target Fisik dan Pendanaan</b>  |
|---|--|
| <p>1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : 003/PAN/REKONS-SUNGSANG/DIS.PUBMTR/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 akan diperlukan pekerjaan tambah kurang sbb :</p> <p><b>a. Pekerjaan Tambah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perkerasan Beton Semen</li><li>- Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus</li></ul> <p><b>b. Pekerjaan Kurang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lapis Pondasi Agregat Kelas B</li><li>- Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A</li><li>- Perbaikan Campuran Aspal Panas</li></ul> <p><b>c. Pekerjaan Baru :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beton FC' 15 mPa</li><li>- Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi</li><li>- Laston Lapis Aus (AC-WC)</li><li>- Marka Jalan Termoplastik</li></ul> | <p>1. - Panjang Fungsional Tetap 11,10 KM<br/>- Panjang Efektif Berubah 2,800 KM</p> <p>2. Nilai Kontrak Tetap.</p> <p>3. Waktu Pelaksanaan Tetap.</p> |

**Catatan :**

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran segera melakukan Amendemen Kontrak atas adanya perubahan berdasarkan Justifikasi Teknik.

Mengetahui :  
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,

**Popo Hartono, ST**  
Penata Tk.I / III.d  
NIP. 19830127 200801 1 002

Palembang, 16 Juli 2024  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

**Upik, ST**  
NIP. 19671111 199203 2 004

**FIELD ENGINEERING**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG**  
Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Telepon (0711) 313431  
**PALEMBANG**

**KEPUTUSAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKU**  
**DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
Nomor : 012 /KPA/UPTD JJ-KAB.OKU/DIS.PU-BMTR/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK**  
**KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**  
**PAKET REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)**  
**DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Dana APBD, maka sebelum pelaksanaan dimulai maupun dalam masa pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan penelitian, evaluasi/kaji ulang dan koreksi terhadap Kontrak menyangkut hal-hal yang sifatnya mendasar antara lain seperti : desain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan dan lain-lain yang dipandang perlu, sehingga penangganan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta diperoleh hasil akhir pekerjaan yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
- b. Bahwa atas pertimbangan pada huruf b diatas, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal dan berkualitas maka perlu dibentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- c. Bahwa penetapan Panitia sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 107);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/BPKAD /2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 821.29/KPTS/0010/DIS.PUBMTR/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin), Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2024 Tanggal 28 Desember 2023.
14. Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) Nomor : 622/00161/DIS.PUBMTR/KONTRAK/2024 Tanggal 06 Juni 2024.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin) Tahun Anggaran 2024.



- KEDUA** : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan pemeriksaan lapangan secara bersama-sama dengan unsur kegiatan (direksi pekerjaan, direksi teknis dan pelaksana konstruksi) pada awal pelaksanaan kontrak;
  - b. Mengadakan penelitian, evaluasi/kaji ulang dan koreksi bila terjadi perubahan atas kontrak menyangkut hal-hal yang sifatnya mendasar seperti antara lain : desain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan dan lain-lain yang dianggap perlu;
  - c. Membuat Berita Acara hasil penelitian, evaluasi/kaji ulang dan koreksi yang telah dilakukan;
  - d. Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada Pelaksana Kegiatan atas penelitian, evaluasi/kaji ulang dan koreksi seperti tersebut pada butir b di atas, dengan mengacu pada prosedur dan peraturan yang berlaku.

**KETIGA** : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak agar menyerahkan hasil kegiatannya kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Biaya - biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Kegiatan Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.0 0.02.0000/001/2024 Tanggal 28 Desember 2023. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Petikan : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DI TETAPKAN DI : P A L E M B A N G  
PADA TANGGAL : 13 JUNI 2024

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

  
**POPO HARTOPO, ST**

Penata Tk. 1/III.d

NIP. 19830127 200801 1 002

**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel (sebagai laporan)
2. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
3. Kepala Bidang Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
4. Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
5. Kepala Bidang Pengendalian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
6. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Muba Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
7. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel

Lampiran 1 : Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  
Paket Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin)  
Nomor : 012 /KPA/UPTD JJ-KAB.OKU/DIS.PU-BMTR/2024  
Tanggal : 13 Juni 2024

**SUBUNAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI  
PAKET REKONSTRUKSI JALAN AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)  
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Nama / NIP  | Kedudukan dalam Panitia | Unsur                                  |
|----|---|-------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                       | 4                                      |
| 1  | <b>UPIK, ST</b><br>NIP. 19671111 199203 2 004                   | Ketua                   | Bidang Jalan                           |
| 2  | <b>HERLY</b><br>NIP. 19670720 199103 1 004                      | Sekretaris              | Bidang Pengendalian, Peralatan dan BMD |
| 3  | <b>RISMAN FRIANSYAH, ST., MT</b><br>NIP. 19850902 201101 1 005  | Anggota                 | UPTD Jalan dan Jembatan Kab. MUBA      |
| 4  | <b>HJ. YOSSY MARISSA, ST., MT</b><br>NIP. 19810324 200801 2 014 | Anggota                 | Bidang Pengembangan Jaringan Jalan     |
| 5  | <b>JONIUS PURWANTO, ST</b><br>NIP. 19790621 200801 1 001        | Anggota                 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi     |

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



**POPO HARTOPO, ST**

Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19830127 200801 1 002
